


DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA



LONGITUD DEL CORREDOR **45,6 KM**

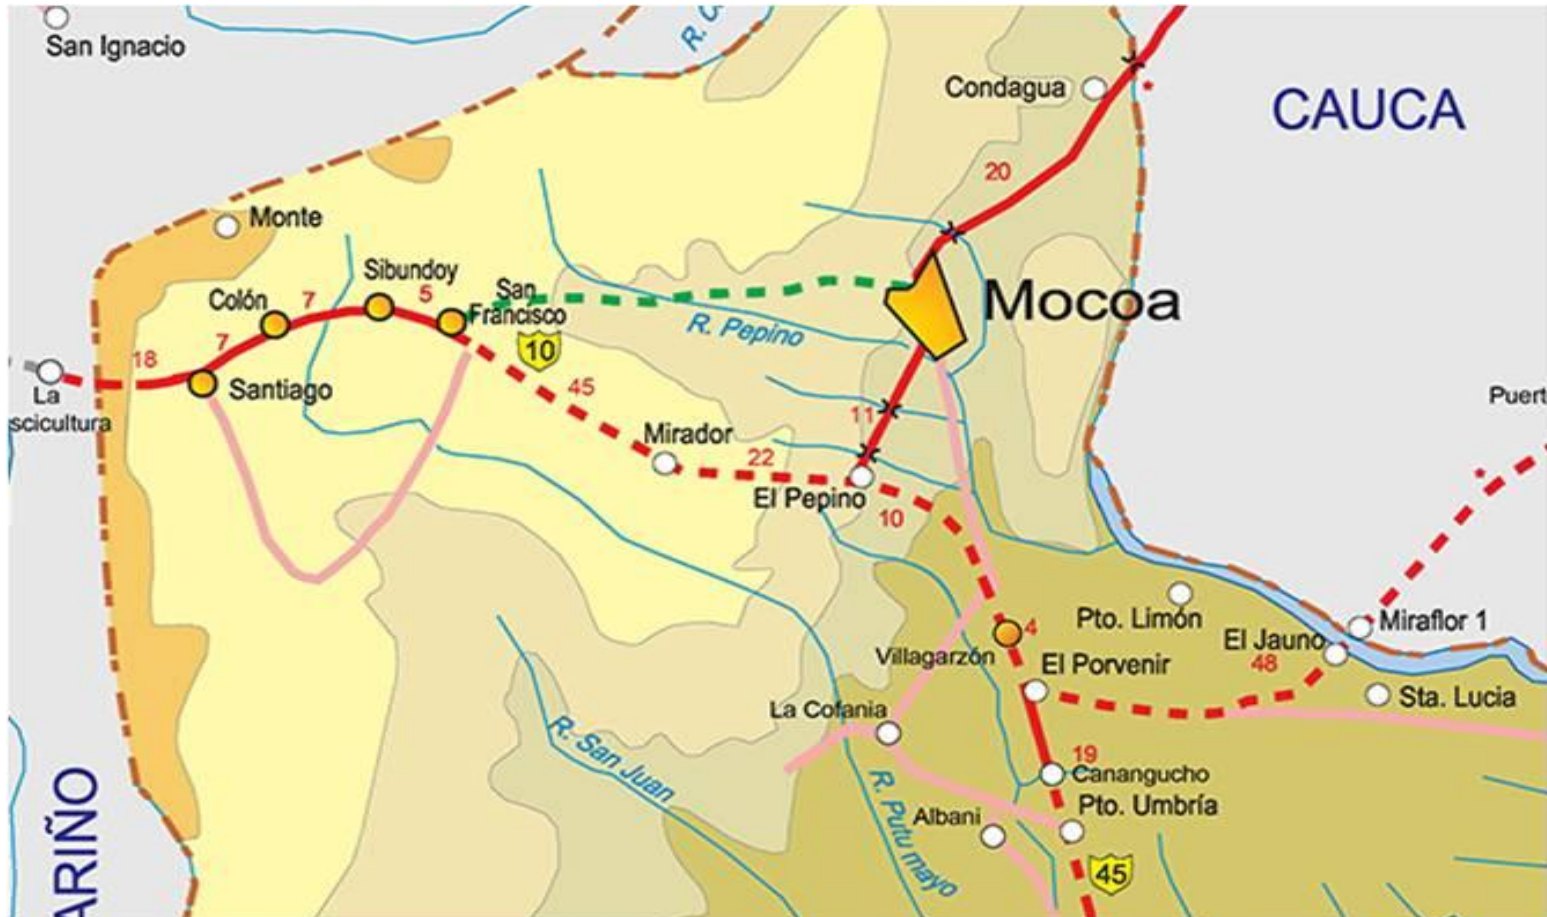

MinTransporte
Ministerio de Transportación y Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

CONTRATISTA OBRA:	Consortio Vial del Sur
CONTRATO No. y/o CONVENIO:	407 de 2010
COMPOSICIÓN:	Sonacol S.A., CASS Constructores & CIA S.C.A., Construcciones El Condor S.A., Latinco S.A., Estructuras Metálicas S.A. y CSS Constructores S.A.
VALOR INICIAL:	\$ 401.550.341.915,00
VALOR ADICIONES:	0
VALOR TOTAL:	\$ 401.550.341.915,00
PLAZO TOTAL:	72 meses
FECHA INICIACION	08, agosto, 2011
FECHA TERMINACIÓN	07, agosto, 2017

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	Consortio Ambiental san Francisco Mocoa
CONTRATO No.	473 de 2010
COMPOSICION:	Solinpro LTDA, G.O.C. S.A.
VALOR INICIAL:	\$ 25.952.948,00
VALOR ADICIONES:	0
VALOR TOTAL:	\$ 25.952.948,00
PLAZO TOTAL:	72 meses
FECHA INICIACION	09, diciembre, 2010
FECHA FINALIZACION	09, abril, 2017

VALOR CONTRATO:	\$ 401.550.341.915	METAS DEL PROYECTO:					AVANCE DEL PROYECTO:				
		Km Explanaciones	Km Afirmado	Puentes y/o Viaducto (Und)	Doble calzada (Km)	Proyección Anual en (Millones)	Km Explanaciones	Km Afirmado	Puentes y/o Viaducto (Und)	Doble calzada (Km)	Avance Anual Facturado en (Millones)
VIGENCIA AÑO 2010	\$ 22.267.100.000	0	0		0	\$ 0	0	0	0	0	\$ 0
VIGENCIA AÑO 2011	\$ 53.582.241.915	0	0		0	\$ 0	0	0	0	0	\$ 0
VIGENCIA AÑO 2012	\$ 53.540.000.000	0	0		0	\$ 53.540	5,7	0	0	0	\$ 47.347,92
VIGENCIA AÑO 2013	\$ 75.848.000.000	0	0		0	\$ 75.848	6,6	0	1	0	\$ 88.712,12
VIGENCIA AÑO 2014	\$ 71.387.000.000	14	0	10	2,1	\$ 71.387	13,37	0	10	0	\$ 35.473,12
VIGENCIA AÑO 2015	\$ 62.463.000.000	LA EJECUCIÓN EN LAS VIGENCIAS 2015 Y 2016 ESTÁ SUJETA A LA DEFINICIÓN DE LOS AJUSTES DE DISEÑO EN LOS SECTORES 2 Y 3.									
VIGENCIA AÑO 2016	\$ 62.463.000.000										
TOTALES		45,6	45,6	49	2,1	\$ 200.775	25,67	0	11	0	\$ 171.533,16

OBSERVACIONES RELEVANTES:

- En el año 2011 se otorgó por concepto de anticipo la suma de \$ 6.324,87 de los cuales se encuentran amortizados en su totalidad.
- Avance en Explanaciones (13.37 Km)
- En construcción 10 puentes: Puente 2 (subestructura), Puente 3 (subestructura), Puente 4 (subestructura), Puente 5 (fundaciones), Puente 6 (superestructura), Puente 7 (acabados), Minchoy (superestructura), Conejo (acabados), Conejito (acabados) y Campucana (superestructura).
- Se encuentra en etapa de revisión y ajuste los diseños en los sectores 2 y 3 para modificación de licencia ambiental.
- Se encuentra en proceso de licenciamiento por parte de CORPOAMAZONÍA para la extracción de material del Frente San Francisco, luego de la protocolización de acuerdos con las comunidades indígenas.


AVANCE FINANCIERO A LA FECHA:

\$ 171.533,16 (42,72%)


VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

LONGITUD DEL CORREDOR **46,6 KM**

VÍA

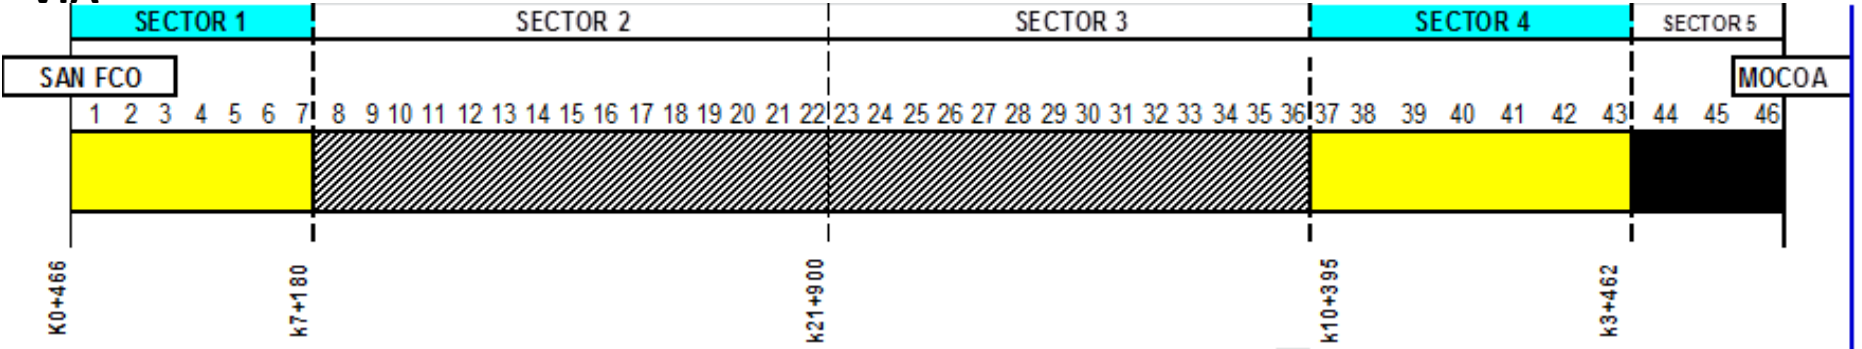

PUENTES

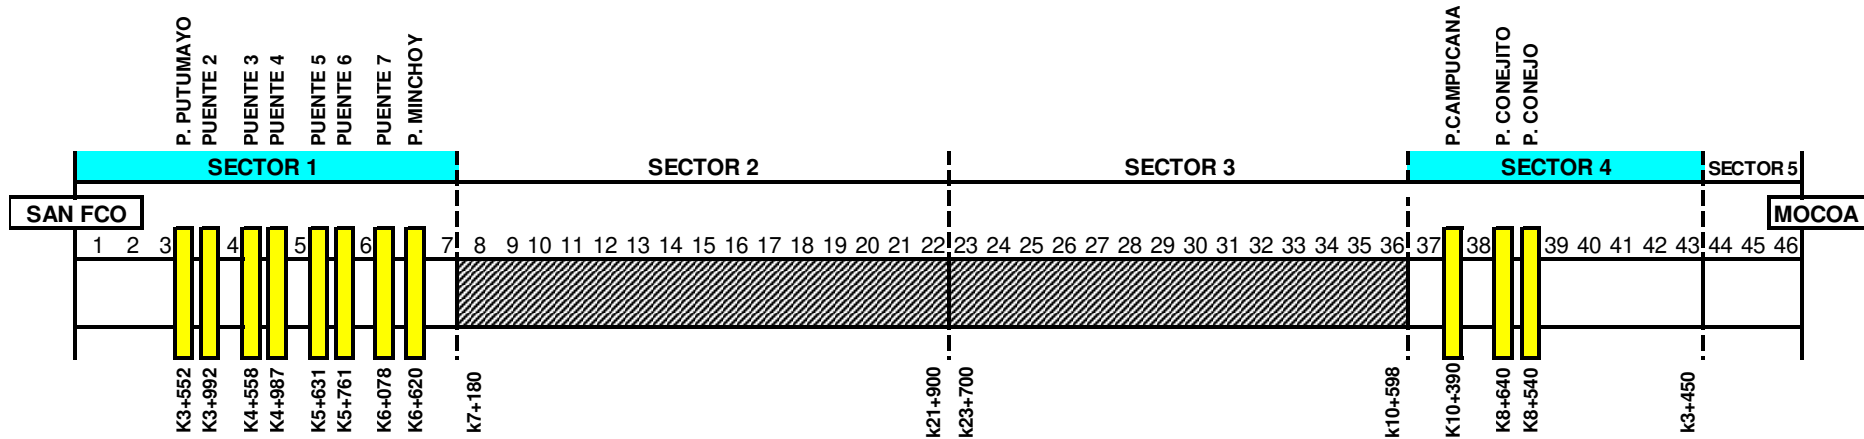

Distribución Inversión por Departamento

San Francisco	60%
Mocoa	40%

Demarcación del Corredor por Departamento

San Francisco	K0+000 – K21+904
Mocoa	K0+000 – k23+754



EN EJECUCIÓN
 SIN INTERVENCIÓN
 AJUSTES DISEÑOS - ZONA DE RESERVA FORESTAL
 SECTORES CON NO OBJECCIÓN DEL BID




MinTransporte
Ministerio de Transportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

Inversión Programada Vs. Ejecutada

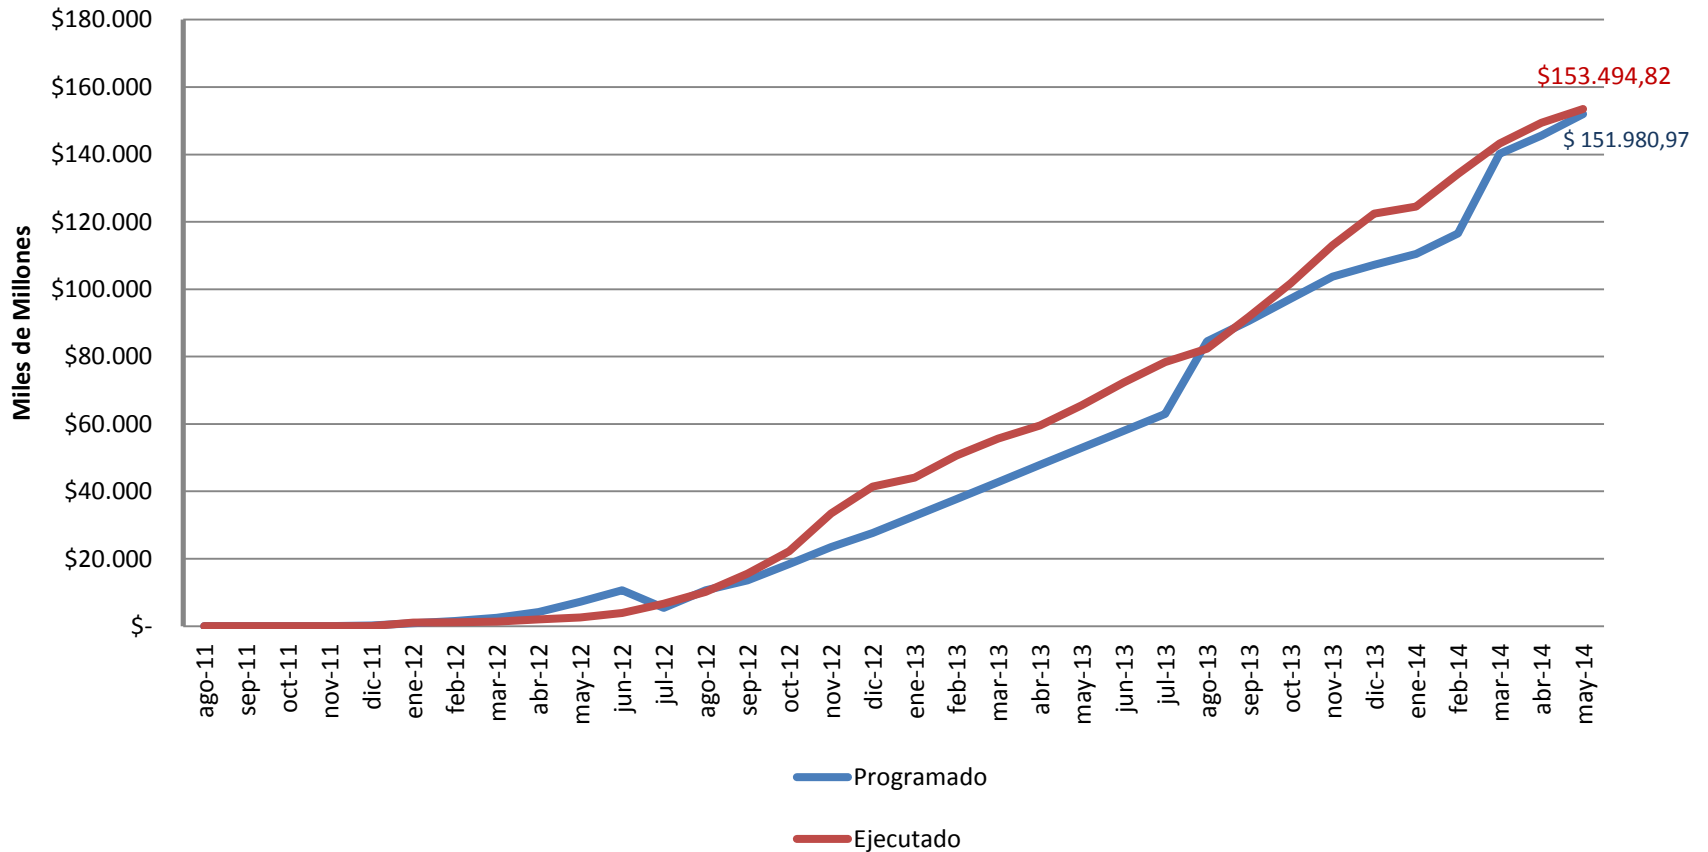

FRENTE DE OBRA SAN FRANCISCO



FRENTE DE OBRA SAN MOCOA

